



नेपाल सरकार
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग

रानी जमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजना

टिकापुर, कैलाली

प.सं.: २०७३/०७७
च.नं.: ४००

फोन नं.: ०९१-५६१२६१
फ्याक्स नं.: ०९१-५६१४२५
सम्पर्क कार्यालय: ०१-५५२०४७९

मिति: २०७६/८/०६

श्री जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग
योजना, कार्यक्रम तथा समन्वय महाशाखा
जावलाखेल, ललितपुर ।

विषय: आ.व. २०७६/७७ को पहिलो चौमासिक प्रगति पठाइएको सम्बन्धमा ।

उपरोक्त सम्बन्धमा यस आयोजना अन्तर्गत संचालित कार्यक्रम (व.उ.शी.नं. ३०८०३११९) को आ.व. २०७६/७७ को पहिलो चौमासिक प्रगति विवरण यसै पत्र साथ संलग्न गरि पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।

.....
(बद्री कार्की)
नि. आयोजना निर्देशक

प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

बजेट तर्जुमासंग सम्वन्धित आर्थिक प्रशासन नियम २०(१) बमोजिमको फाराम

१. आ. व. : २०७६/०७७
 २. बजेट उन्निर्धारक नं. : ३०८३११९
 ३. मन्त्रालय : उर्बा, कलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
 ४. विभाग / संस्था : जलश्रोत तथा सिंचाइ विभाग
 ५. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम : गनी जमरा कुनारिया सिंचाइ आयोजना (प्रगती आधुनिकरण सुदेल)
 ६. जिल्ला : कैलाली
 ७. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम : श्री मोहन कुमार श्रेष्ठ
 ८. वार्षिक बजेट (रु.) : २४२३४.००
 ९. वार्षिक बजेट (रु.) : १५९१६.४९
 (क) आन्तरिक : ०.००
 (ख) वैदेशिक : १५९१३.००
 (ग) स्टडी दर : १५९१३.००
 (घ) दातृ संस्था : आई डि ए
 २) स्थानीय निकाय / संस्था : अनुदान
 ३) जनसहभागिता : ०.००
 (ग) दातृ संस्था : आई.डी.प
 (ख) वैदेशिक (१) ऋण : १०.२७
 (२) अनुदान : १०.२७
 (क) आन्तरिक (१) नेपाल सरकार : ३१३१.३७
 (२) स्थानीय निकाय / संस्था : ३०४१.०९
 (३) जनसहभागिता : ३१३१.३७
 (क) माग गर्नु पर्ने रकम : १३११.५३
 (ख) माग गरेको रकम : १३११.५३
 (ग) प्राप्त हुन बाँकी रकम : १३११.५३
 (घ) प्राप्त हुन बाँकी रकम : १३११.५३

१५. चौसितिक प्रगति (प्र.श. भौतिक

८१.२९

वित्तिय

८३.२७

रु लाखमा

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाइ	वार्षिक लक्ष्य				प्रथम चौमासिक लक्ष्य				प्रथम चौमासिक प्रगति				प्रतिवेदन अवधिभरमा यस आ. व. को प्रगति				सूचकमा आधारित प्रमुख परिमाण		कैफियत
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	परिमाण	भार	परिमाण	भार	परिमाण	भार	परिमाण	भार	परिमाण	भार	
१	पूरीगत खर्च अन्तरगतका कार्यक्रमहरु:	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	१६
अ)	नेपाल सरकार																					
१.१.२.२.७	जमरा खरीद/ मुश्राला(जमरा खरीद/ मुश्राला)	३१४११	हेक्टर	२०.००	४४.७०	१३७५.००	१९.९६	११.०६	२१११.०९	४५.२५	११.३२											
१.१.४.१५.१	हेडवर्स/इन्टेक निर्माण	३११५५	प्र.म.	५०.००			०.००															
१.१.४.१५.१.६	इन्टेक संरचना निर्माण (रमालि केन डिस्चार्ज रेगुलेटर तथा रेगुलेटर किडिंग)		प्र.म.	५०.००	२.०६	१०००.००	०.००	०.००	०.००	३०.००	१.२४	३०.००	१.२४									
१.१.४.१५.२	नहर निर्माण कार्य (सिंचाइ प्रगतीको निर्माण)		कि.मी.	२.९०			१.३३															
१.१.४.१५.२.१०	सूत नहर लाइनिङ कार्य		कि.मी.	०.६०	१.६५	४००.००	०.६०	१.६५	४००.००	०.६०	१.२४	०.६०	१.२४									
१.१.४.१५.२.१६	सिंचाइ नहर निर्माण कार्य		कि.मी.	०.१०	०.४१	१००.००	०.१०	०.४१	१००.००	०.००	०.००	०.००	०.००									
१.१.४.१५.२.१७	फिटर नहरमा संरचना निर्माण कार्य		वटा	२.००	१२.३८	३०००.००	०.४३	२.६६	५००.००	०.४५	२.७९	०.४५	२.७९									

[Handwritten signature]

प्रभाणिता गर्भे

कार्यक्रम / क्रियाकलाप		खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य						प्रथम त्रैमासिक लक्ष्य						प्रतिवेदन अवधिसम्म यस आ. व. को प्रति						सूचकमा आधारित प्रमुख	कैफियत
				परिमाण			प्रतिशत			परिमाण			प्रतिशत			परिमाण			प्रतिशत				
				आर	लागत	६	आर	लागत	१०	आर	लागत	११	आर	लागत	१२	आर	लागत	१३	आर	लागत	१४		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६								
११.५.२८.९	नियुक्त अध्ययन कार्य	३११७२	वटा	२.००	०.४१	१००.००	०.००	०.००	०.२५	०.०५	०.२५	०.२५	०.०५	०.०५	०.२५	२.२५							
११.५.२८.३१	युक्त प्रभावित अध्ययन कार्य	३११७२	वटा	३.००	०.१२	३०.००	१.००	०.०४	१०.००	१.००	०.०४	१.००	०.०४	१.००	०.०४	१.००							
११.५.२८.४९	WIA Status and Performance Evaluation कार्य	३११७२	वटा	२.००	०.१७	४०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००							
११.५.२८.५०	आयोजना प्रभावित कमाण क्षेत्रका कृषकहरूको VCDP/CHSI समूह अध्ययन कार्य	३११७२	वटा	४.००	०.०८	२०.००	२.००	०.०४	१०.००	०.५०	०.०१	०.५०	०.०१	०.०१	०.५०	०.५०							
११.५.२८.५१	तेस्रो चरणको तयारीको लागि आवश्यक अध्ययन परामर्श कार्य (अथवा देखि कान्छा खेता समूह सिर्जना विस्तार)	३११७२	प्र.म.	५.००	०.१२	३०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००							
११.५.४०.५	अन्य सूत्रीगत अनुसन्धान तथा परामर्श कार्य	३११७२	संख्या	४.००	०.१६	३९.९०	१.००	०.०४	१०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००							
११.६.३.५	App and website development	३११३२	वटा	१.००	०.०२	६.००	०.००	०.००	०.००	०.५०	०.०१	०.५०	०.०१	०.५०	०.०१	०.५०							
११.६.१३.२९	कार्यालयको लागि फर्निचर सिर्जना	३११२३	संख्या	६.००	०.०३	७.००	२.००	०.०१	२.००	२.००	०.०१	२.००	०.०१	२.००	०.०१	२.००							
क.	सूत्रीगत खर्च कार्यक्रम को नामा				९.६.१०	२३७८९.००	६५.५५	१७.३७	३६१२.५९	५५.००	१२.०६	५५.००	१२.०६	५५.००	१२.०६								
आ.	चाहू खर्च अन्तर्गत कार्यक्रमहरू					३०.००		०.०४	१०.०९		०.०५	०.००	०.०५										
१.६.४.१	कर्मचारीको योगदानमा आधारित बीमा कोष खर्चा(कर्मचारी/प्रदधिकारी सामाजिक सुरक्षा)	२१२१३	जना	३६	०.०१	२	१२	०.००	०.६६	१२.००	०.००	१२.००	०.००	१२.००	०.००	१२.००							
२.५.७.२	रा.प. अन. प्रथम वा सो सहस्र कर्मचारी (व्यक्ति कारा)	२२४१३	जना	२	०.०३	६.११	१	०.०१	२.०३	१.००	०.०१	१.००	०.०१	१.००	०.०१	१.००							
२.५.७.३	रा.प. अन. द्वितीय वा सो सहस्र कर्मचारी (व्यक्ति कारा)	२२४१३	जना	१	०.०१	२.८८	०.३३	०.००	०.९६	०.३३	०.००	०.३३	०.००	०.३३	०.००	०.३३							
२.५.७.६	श्रेणी विहित वा सो सहस्र कर्मचारी (व्यक्ति कारा)	२२४१३	जना	३	०.०३	६.३३	१	०.०१	२.११	१.००	०.०१	१.००	०.०१	१.००	०.०१	१.००							
२.५.७.७	रु.स.चासक वा सो सहस्र कर्मचारी (व्यक्ति कारा)	२२४१३	जना	५	०.०५	११.५८	१.६६	०.०२	३.९७	१.६६	०.०२	१.६६	०.०२	१.६६	०.०२	१.६६							
२.५.७.९	स्वीकृत दरबन्दी िमश्रमा कर्मचारीहरूको पोषाक खर्चा(तेस्रो कारा)	२२४१३	जना	११	०.००	१.१	३.६६	०.००	०.३६	३.६६	०.००	३.६६	०.००	३.६६	०.००	३.६६							
१	नेपाल सरकार					२१४		०.२९	७९.७९		०.२९		०.२९		०.२९								
१.१.१.३	रा.प. प्रथम (स्थायी कर्मचारी)	२११११	जना	१	०.०३	७.०३	०.३३	०.०१	२.७१	०.३३	०.०१	०.३३	०.०१	०.३३	०.०१	०.३३							
१.१.१.४	रा.प. द्वितीय (स्थायी कर्मचारी)	२११११	जना	७	०.१८	४३.८७	२.३३	०.०६	१६.८८	२.३३	०.०६	२.३३	०.०६	२.३३	०.०६	२.३३							
१.१.१.५	रा.प. तृतीय (स्थायी कर्मचारी)	२११११	जना	१६	०.३७	८९.०९	५.३३	०.१२	३४.२१	५.३३	०.१२	५.३३	०.१२	५.३३	०.१२	५.३३							
१.१.१.६	रा.प. अन. प्रथम (स्थायी कर्मचारी)	२११११	जना	१०	०.१८	४४.४९	३.३३	०.०६	१७.११	३.३३	०.०६	३.३३	०.०६	३.३३	०.०६	३.३३							
१.१.१.७	रा.प. अन. द्वितीय (स्थायी कर्मचारी)	२११११	जना	२	०.०४	८.४२	०.६६	०.०१	३.२८	०.६६	०.०१	०.६६	०.०१	०.६६	०.०१	०.६६							

कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शैक्षिक	इकाइ	वार्षिक लक्ष्य				प्रथम त्रैमासिक लक्ष्य				प्रथम त्रैमासिक प्रगति				प्रतिवेदन अवधिसमाप्त आ.व.को प्रगति				कुलकमा आधारीत प्रमुख	कैफियत
			परिमाण	भार	लगत	परिमाण	भार	लगत	परिमाण	भार	लगत	परिमाण	भार	लगत	परिमाण					
१	२	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६						
१.२.२.१	स्थानी कर्मचारीको मर्हती भत्ता(मर्हती भत्ता)	जना	३६	०.०४	९	१२	०.०१	२.९५	१२.००	०.०१	१२.००	०.०१	१२.००	०.०१	१२.००	०.०१	१२.००			
१.३.१.१	निजामति कर्मचारी पोशाक (कर्मचारी पोशाक)	जना	३६	०.०२	४	०	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००			
२.६.१.१	कर्मचारी दक्षता वृद्धि तालिम (प्रमाण पत्र दिने)(तालिम तथा गोष्ठी)(कर्मचारी दक्षता वृद्धि तालिम (प्रमाण पत्र दिने))	पटक	३	०.०२	५	१	०.०१	१.६५	१.००	०.०१	१.००	०.०१	१.००	०.०१	१.००	०.०१	१.००			
२.६.६.४	अन्य विविध खर्च(चिपयान खर्च)	पटक/संख्या	१	०.०१	३	०.३३	०.००	१	०.३३	०.००	०.३३	०.००	०.३३	०.००	०.३३	०.००	०.३३			
२	विद्युत बिल				२०१	०.२२	५१.२१		०.२२	०.२२	०.२२	०.२२	०.२२	०.२२	०.२२	०.२२	०.२२			
२.१.१.१	घाटाको महसुल (घाटाको महसुल)	पटक	१	०.०१	३.१२	०.३३	१.०२	०.३३	०.३३	०.००	०.३३	०.००	०.३३	०.००	०.३३	०.००	०.३३			
२.१.२.१	विजुली महसुल (विजुली महसुल)	पटक	७	०.०२	५.३४	२.३३	०.०१	१.६८	२.३३	०.०१	२.३३	०.०१	२.३३	०.०१	२.३३	०.०१	२.३३			
२.१.३.४	कार्यालय प्रयोजनको लागि पानी (पिउने पानी)	संख्या	१	०.०१	१.५४	०.३३	०.००	०.६४	०.३३	०.००	०.३३	०.००	०.३३	०.००	०.३३	०.००	०.३३			
२.१.६.११	टेलिफोन महसुल/ ईन्टरनेट सेवा महसुल/बिटी पर्सल रजिष्टरी सुपियर खर्च समेत (टेलिफोन महसुल)	मर्हता	१.७५	०.०६	१४	०.५८	०.०२	४.५५	०.५८	०.०२	४.५५	०.०२	०.५८	०.०२	०.५८	०.०२	०.५८			
२.२.२.४	मोबिल (इन्धन कार्यालय प्रयोजन)	लीटर	५८१.१६	०.०२	४.४२	१९३.७	०.०१	१	१९३.७०	०.०१	१	१९३.७०	०.०१	१	१९३.७०	०.०१	१९३.७०			
२.२.२.९	कार (कार्यालयको इन्धन)	लीटर	८४०	०.००	०.४७	२८०	०.००	०.३	२८०.००	०.००	०.३	२८०.००	०.००	०.३	२८०.००	०.००	२८०.००			
२.२.२.१०	मोटरसाइकल (कार्यालयको इन्धन)	लीटर	२२२१२	०.०१	२.५१	७६०	०.००	१.२	७६०.००	०.००	१.२	७६०.००	०.००	१.२	७६०.००	०.००	७६०.००			
२.२.२.१४	लुकेटस मोटरसाइकल (कार्यालयको इन्धन)	लीटर	२२२१२	०.०१	१.५२	६६.८	०.००	०.५	६६.८०	०.००	०.५	६६.८०	०.००	०.५	६६.८०	०.००	६६.८०			
२.२.२.१५	मिश्रण / विष फिल्ट कार्याको लागि (कार्यालयको इन्धन)	लीटर	७५६०	०.०३	८.०८	२५.२०	०.०१	२	२५.२०.००	०.०१	२	२५.२०.००	०.०१	२	२५.२०.००	०.०१	२५.२०.००			
२.२.३.८	जेनेटरका लागि इन्धन (इन्धन-अन्य प्रयोजन)	पटक/संख्या	१२	०.०२	४	४	०.०१	१.२	४.००	०.०१	४.००	०.०१	४.००	०.०१	४.००	०.०१	४.००			
२.३.१.९	सबारी साधन मर्मत तथा सभार (सबारीसाधन मर्मत)	पटक	१२	०.०५	१२	४	०.०२	३.६	४.००	०.०२	४.००	०.०२	४.००	०.०२	४.००	०.०२	४.००			
२.४.१.१३	कार्यालय संचालन खर्च (कार्यालय मसलन् सामान खर्च)	नभएको	१२	०.०७	१६	४	०.०२	५.१	४.००	०.०२	४.००	०.०२	४.००	०.०२	४.००	०.०२	४.००			
२.६.४.११	जल उपभोक्ताहरूको शिप विकास तथा जन चेतना तालिम तथा गोष्ठी(उपभोक्ता शिप विकास / सशक्तिकरण / सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम)	पटक/संख्या	८	०.१७	४०.४३	१	०.०२	५	१.००	०.०२	१.००	०.०२	१.००	०.०२	१.००	०.०२	१.००			

क्र.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक लक्ष्य				प्रथम त्रैमासिक लक्ष्य				प्रथम त्रैमासिक प्रगति				प्रतिवेदन अवधिसमय यम आ.व. को प्रगति				कुलकमा आधारित प्रमुख	कैफियत
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	परिमाण	भार								
														५	६	७	८	९	१०		
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६						
२.६.४.१२	चलउपभोग संस्था भणग - आयोजना समन्वित अनुसार (PIM मा उल्लेखित)(उद्यमशीलता .रोजगारी मुलक / सशक्तिकरण / सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम)	२२५१२	पटक/सङ्ख्या	३	०.१०	२४	१	०.०३	८	१.००	०.०३	१.००	०.०३	१.००							
२.६.४.१३	स्थानीय बातावरणीय व्यवस्थापन समिति (LEMC) बैठक तथा अनुमान कार्य - आयोजना समन्वित अनुसार (PIM मा उल्लेखित)(उद्यमशीलता .रोजगारी मुलक / सशक्तिकरण / सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम)	२२५१२	पटक/सङ्ख्या	४	०.०३	८	१	०.०१	२	१.००	०.०१	१.००	०.०१	१.००							
२.६.४.१४	Project Steering Committee बैठक - योजना समन्वित अनुसार (PIM मा उल्लेखित)(उद्यमशीलता .रोजगारी मुलक / सशक्तिकरण / सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम)	२२५१२	पटक/सङ्ख्या	२	०.००	१	१	०.००	०.५	१.००	०.००	१.००	०.००	१.००							
२.६.४.१५	Scheme Consturction and Coordi Committee (SCC) बैठक - आयोजना समन्वित अनुसार (PIM मा उल्लेखित)(उद्यमशीलता रोजगारी मुलक / सशक्तिकरण / सीप विकास क्षमता अभिवृद्धि तालिम)	२२५१२	पटक/सङ्ख्या	३	०.००	०.९	१	०.००	०.३	१.००	०.००	१.००	०.००	१.००							
२.६.४.१६	उपभागा समिति (४८ उपभागा) तह संस्थागत विकास सुश्रुतिकरण सहयोग (साइकल खरिद, फर्निचर खरिद आदि) - आयोजना समन्वित अनुसार (PIM मा उल्लेखित)(उद्यमशीलता .रोजगारी मुलक / सशक्तिकरण / सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम)	२२५१२	पटक/सङ्ख्या	१	०.०४	१०	०.५	०.०२	५	०.५०	०.०२	०.५०	०.०२	०.५०							
२.६.४.१७	पुस्तिका तयारी, प्रकाशन तथा वितरण कार्य (अध्ययन/पारमर्श सेवा) - आयोजना समन्वित अनुसार (PIM मा उल्लेखित)(उद्यमशीलता .रोजगारी मुलक / सशक्तिकरण / सीप विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम)	२२५१२	पटक/सङ्ख्या	१	०.०४	९.६७	०	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००							
२.६.४.१९	दालको procurement guidelines समन्वि अध्ययन समन्वि कार्यक्रम/प्रकार प्रकार तथा सामग्री उपभोग तथा प्रकाशन र वितरण)	२२५२२	पटक/सङ्ख्या	१	०.०२	४	०	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००							
२.६.१.९	अनुमान भणग खर्च (अनुमान मुल्याङ्कन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन भणग खर्च)	२२६११	पटक/सङ्ख्या	२६.२	०.०३	८	८.७३	०.०१	२.६२	८.७३	०.०१	८.७३	०.०१	८.७३							
२.६.२.७	आन्तरिक भणग (आन्तरिक भणग)	२२६१२	पटक	१	०.०४	१०	०.३३	०.०१	३	०.३३	०.०१	०.३३	०.०१	०.३३							
२.६.२.४	सवारी साधन/वीमा सवारी साधन)	२२२१४	रु	१	०.०२	५	०	०.००	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००							

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाइ	वार्षिक लक्ष्य			प्रथम चैमासिक लक्ष्य			प्रथम चैमासिक प्रगति			प्रतिवेदन अवधिसमय यत्न आ.व. को प्रगति			सूचकमा आधारित प्रसङ्ग	कैफियत
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	लागत		
१		२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५		१६
८.१.३.१	कार्यालय प्रयोजनको लागि घर भाडा(कार्यालयको घर भाडा)	२८१४२	महिना	१२	०.०३	७	४	०.०१	२	४.००	०.०१	४.००	०.०१	४.००	४.००		
ख.	चातु खर्च कार्यक्रमको चम्मा				१.८४	४४४.००		०.५८	१४१.०९		०.५५			०.५५			
	कुल चम्मा खर्च (क + ख)				१००.००	२४२३४.००		१५.५२	३७६०.६८		१२.६१			१२.६१			

प्रथम चैमासिक प्रगति = १२.६१ / १५.५२ X १०० = ८१.२९ प्र.श.
चैमासिक भारित प्रगति = ५५.०० / ६५.५५ X १७.३७ = १४.५७ प्र.श.

५५.५७

५५.५७


५५.५७

आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि समस्या समाधान गर्ने उपायहरू:

क्र.स.	कार्योजना अनुसार सम्पन्न हुन नसकेका कामहरू	सम्पन्न हुन नसक्नुका कारणहरू	समस्या समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरू	समस्या समाधानका उपायहरू
१	ऐलानी जग्गा प्राप्ति कार्य	●मन्त्रिपरिषदबाट ऐलानी जग्गा र त्यसमा परेका घरहरूको राहत रकम वितरण सम्बन्धि निर्णय छिटो गर्नु पर्ने ।	ऐलानी जग्गा प्राप्तिका लागि फेरि नयाँ प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको ।	ऐलानी जग्गा प्राप्ति सम्बन्धि अन्य सिंचाइ आयोजनाहरूको (महाकाली सिंचाइ आयोजना तेस्रो चरण) निर्णय अनुरूप निर्णय हुनुपर्ने ।

फोटोहरू


१. लम्बिक विस्तार अन्तर्गत मुख्य कुलोको लाइनिङ

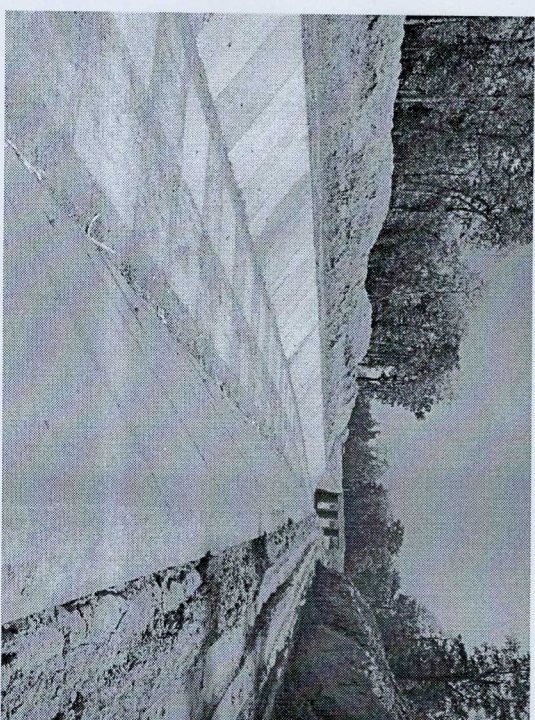

१५

Open

२. रानी जमरा कुलरीया सिंचाइ आयोजनाले निर्माण सम्पन्न गरेको कर्णाली नदिमा साइड इन्टेक

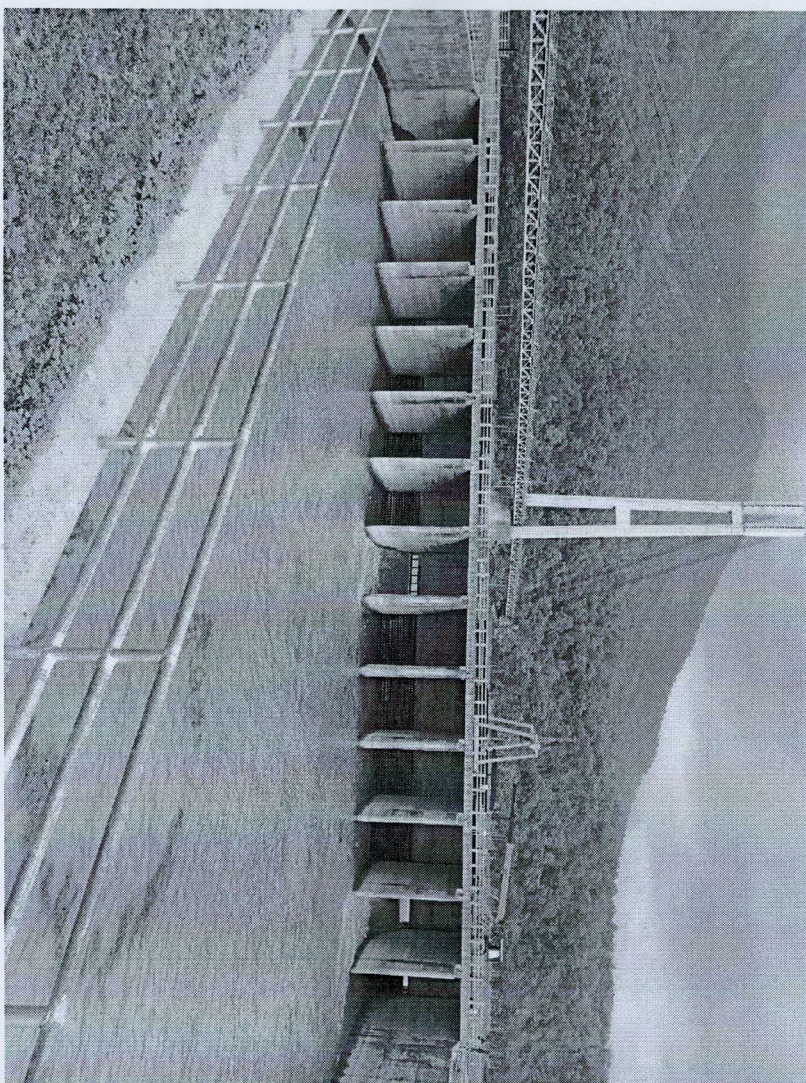

म

म

म

३. सिंचित क्षेत्र बचावत कार्य अन्तर्गत कर्णाली नदीमा निर्माण गरिएको तटबन्ध




Dr. M.

W

Dr.



४. फिडर शाखामा निर्माण गरिएको जनावरको आवत जावतको निर्माण गरिएको कसिङ्ग

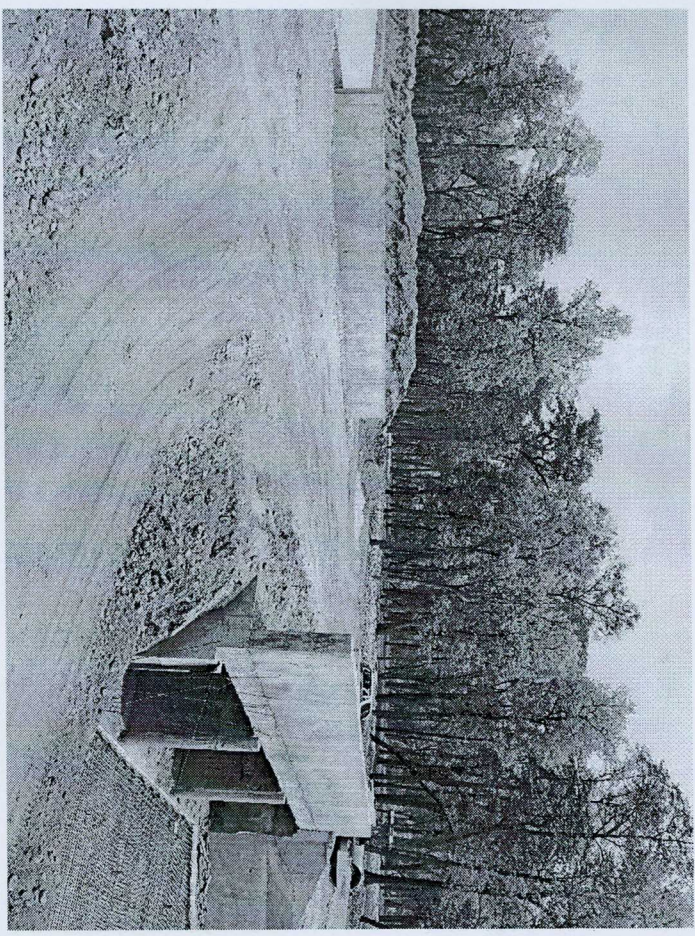

मन्त्रालय

१५

१५
